

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CALKINÍ

SECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

NUMERO DE OFICIO: HAC/DPM/0119/2012.

ASUNTO: SE ENVIA AVANCE TRIMESTRAL 2012.

Calkiní, Campeche, a 09 de Julio de 2012.
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 12 horas

"2012, AÑO DE LA CULTURA MAYA"

C.P. TIRSO A. R. DE LA GALA GOMEZ
SECRETARIO DE FINANZAS
CAMPECHE, CAMPECHE
PRESENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA



RECIBIDO
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
10 JUL 2012
CON AT'N
SUBSECRETARIA DE PROGRAM. Y PRESUP.
DIRECCION DE PROGRAMACION

Anexo al presente me permito enviarle el **Avance Físico-Financiero Trimestral y los Cuadros de Indicadores de Recursos Ejercidos en el Trimestre**, en sus modalidades de: Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), C.D.I., HABITAT, PDZP, Y FONHAPO.

Por esta razón el H. Ayuntamiento le envía los cuadros según obras ejercidas en el periodo correspondiente al **Segundo Trimestre (Abril-Junio de 2012)**, para que personal a la Dependencia a su digno cargo sirva realizar su revisión.

Sin más por el momento y esperando vernos favorecidos con su atención le reitero mi gratitud.

SECRETARIA DE FINANZAS
RECIBIDO
10 JUL 2012
11:30
HORA
Recepción de Correspondencia
Gobierno del Edo. de Campeche

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
Calkiní, Campeche.



LIC. CECILIO SILVESTRE SEGOVIA HAC 2009 - 2012

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE CAMPECHE



2012

RECIBIDO
10 JUL. 2012

- C.C.P. PROFR. CARLOS EDUARDO SANGUINO CARRIL.- Presidente Municipal.
- C.C.P. C.P. JORGE MARTIN PACHECO PEREZ.- Auditor Superior del Estado.
- C.C.P. LIC. JORGE HUMBERTO SHIELDS RICHAUD.- Secretario de la Contraloría del Gob. del Estado.
- C.C.P. LIC. OSCAR DE JESÚS PACHECO LOPEZ.- Delegado de la Sedesol Federal de Campeche
- C.C.P. PROFR. MARTIN TURRIZA EUAN.- Tesorero Municipal.
- C.C.P. C.P. FERNANDO CANUL HERRERA.- Contralor Interno Municipal.
- C.P. Archivo.

Calle 15 S/N. entre 18 y 16, Barrio de la Concepción, Calkiní, Camp

Cecilio Segovia
11:35 hrs.

H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

AVANCE TRIMESTRAL

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2012)

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2012

MONTO A EJERCER 2012: \$39,468,767.00

DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	No. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	INVERS. APROB. (PESOS)	INVERSION EJERCIDA (PESOS)				AVANCES				% DE EJECUCION DEL LOS REC. EN EL AÑO X TRIM.	OBSERV.
							EN EL TRIMESTRE		ACUMULADA		FISICO		FINANCIERO			
							MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	ACUMULADA	TRIM %	ACUM %		
GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL. (INDIRECTOS)	VARIAS	IT	22/02/11 31/12/11	333MIND001001	23-Feb-11	\$ 966,202.14	\$ 299,348.55	\$ 299,348.55	\$ 542,431.32	\$ 542,431.32	30.00	55.00	30.98	56.14	0.76%	AD
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO CON GENERADOR ELECTRICO PARCELA "CUATRO CAMINOS"	BECAL	IT	07/02/12 28/02/12	333MAPR001001	06-Feb-12	\$ 243,064.00	\$ 242,511.90	\$ 242,511.90	\$ 242,511.90	\$ 242,511.90	100.00	100.00	99.77	99.77	0.61%	C
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO CON GENERADOR ELECTRICO PARCELA "DULCE RODRY"	SANTA CRUZ PUEBLO	IT	07/02/12 29/02/12	333MAPR001002	06-Feb-12	\$ 243,064.00	\$ -	\$ -	\$ 242,658.17	\$ 242,658.17	-	100.00	-	99.83	0.00%	C
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO CON GENERADOR ELECTRICO PARCELA "EL ALUX"	SANTA CRUZ PUEBLO	IT	07/02/12 29/02/12	333MAPR001003	06-Feb-12	\$ 243,064.00	\$ -	\$ -	\$ 242,658.17	\$ 242,658.17	-	100.00	-	99.83	0.00%	C
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARCELA "LA GUADALUPANA"	NUNKINI	IT	10/02/12 10/03/12	333MAPR001004	06-Feb-12	\$ 184,915.00	\$ 184,310.18	\$ 184,310.18	\$ 184,310.18	\$ 184,310.18	100.00	100.00	99.67	99.67	0.47%	C
CONSTRUCCION DE TERRACERIA CAMINO SAN MATEO.	DZITBALCHE	IT	06/02/12 06/04/12	333MAPR001005	06-Feb-12	\$ 1,196,176.00	\$ 993,128.61	\$ 993,128.61	\$ 993,128.61	\$ 993,128.61	100.00	100.00	83.03	83.03	2.52%	C
CONSTRUCCION DE TERRACERIA TRAMO CARRETERA DZITBALCHE-SANTA CRUZ PUEBLO KM-2.	DZITBALCHE	IT	07/02/12 15/03/12	333MAPR001006	06-Feb-12	\$ 627,260.00	\$ 625,900.81	\$ 625,900.81	\$ 625,900.81	\$ 625,900.81	100.00	100.00	99.78	99.78	1.59%	C
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO CON SISTEMA DE RIEGO PARCELA "LA CURVA"	NUNKINI	IT	07/02/12 10/03/12	333MAPR001007	06-Feb-12	\$ 200,000.00	\$ 199,266.20	\$ 199,266.20	\$ 199,266.20	\$ 199,266.20	100.00	100.00	99.63	99.63	0.50%	C
CONSTRUCCION DE TERRACERIA ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL CALKINI-BECAL KM-6 RUMBO A PARCELAS.	BECAL	IT	10/02/12 29/03/12	333MAPR001008	06-Feb-12	\$ 521,913.00	\$ 421,232.93	\$ 421,232.93	\$ 421,232.93	\$ 421,232.93	100.00	100.00	80.71	80.71	1.07%	C
CONSTRUCCION DE TERRACERIA ENTRONQUE CAMINO TELCHAK RUMBO A BODEGA DE ALMACENAMIENTO CAMINO REAL.	DZITBALCHE	IT	06/02/12 15/04/12	333MAPR001009	06-Feb-12	\$ 366,314.00	\$ -	\$ -	\$ 366,191.10	\$ 366,191.10	-	100.00	-	99.97	0.00%	C
PERFORACION DE POZO Y EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE RIEGO (CONVENIO PROCAPI)	NUNKINI	IT	02/04/12 30/04/12	333MAPR001010	06-Feb-12	\$ 265,018.00	\$ 3,850.92	\$ 3,850.92	\$ 3,850.92	\$ 3,850.92	100.00	100.00	1.45	1.45	0.01%	C
CONSTRUCCION DE TERRACERIA RUMBO A UNIDADES AGROPECUARIAS SAN ISIDRO.	NUNKINI	IT	10/02/12 30/03/12	333MAPR001012	06-Feb-12	\$ 1,435,755.00	\$ 1,003,329.69	\$ 1,003,329.69	\$ 1,433,328.13	\$ 1,433,328.13	70.00	100.00	69.88	99.83	2.54%	C
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA RUMBO A PARCELA "EL PIXOY"	NUNKINI	IT	06/02/12 07/05/12	333MAPR001013	06-Feb-12	\$ 1,483,763.00	\$ 745,941.00	\$ 745,941.00	\$ 1,191,838.12	\$ 1,191,838.12	40.00	70.00	50.27	80.33	1.89%	C
PAVIMENTACION DE CALLES	SAN ANTONIO SAHCABCHEN	IT	15/02/12 15/04/12	333MAPR001014	10-Feb-12	\$ 1,046,475.35	\$ 732,443.56	\$ 732,443.56	\$ 1,046,347.95	\$ 1,046,347.95	70.00	100.00	69.99	99.99	1.86%	C
PAVIMENTACION DE CALLES.	TEPAKAN	IT	30/04/12 29/02/12	333MAPR001015	10-Feb-12	\$ 959,249.00	\$ 437,435.89	\$ 437,435.89	\$ 959,171.99	\$ 959,171.99	50.00	100.00	45.60	99.99	1.11%	C
PAVIMENTACION DE CALLES.	DZITBALCHE	IT	01/03/12 31/05/12	333MAPR001016	10-Feb-12	\$ 2,434,660.00	\$ -	\$ -	\$ 1,790,741.76	\$ 1,790,741.76	40.00	90.00	-	73.55	0.00%	C
PAVIMENTACION DE CALLES.	BACABCHEN	IT	01/03/12 31/05/12	333MAPR001017	10-Feb-12	\$ 1,053,633.00	\$ 727,118.31	\$ 727,118.31	\$ 727,118.31	\$ 727,118.31	92.00	92.00	69.01	69.01	1.84%	C
CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN LA CALLE 15 ENTRE 20 Y 22.	CALKINI	IT	01/03/12 30/03/12	333MAPR001018	10-Feb-12	\$ 54,826.00	\$ 795.23	\$ 795.23	\$ 54,262.89	\$ 54,262.89	-	100.00	1.45	98.97	0.00%	C
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	SAN AGUSTIN CHUNHUAS	IT	01/03/12 30/05/12	333MAPR001019	16-Feb-12	\$ 402,321.00	\$ 193,658.41	\$ 193,658.41	\$ 314,239.63	\$ 314,239.63	70.00	100.00	48.14	78.11	0.49%	C
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	SANTA MARIA	IT	01/03/12 31/05/12	333MAPR001020	16-Feb-12	\$ 402,534.00	\$ 188,235.42	\$ 188,235.42	\$ 308,693.62	\$ 308,693.62	70.00	100.00	46.76	76.69	0.48%	C

H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
AVANCE TRIMESTRAL

RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2012)

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2012
 MONTO A EJERCER 2012: \$39,468,767.00

DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	FECHA DE INICIO Y TERMINO (MES Y AÑO)	No. OFICIO DE APROBACION	FECHA APROBACION	INVERS. APROB. (PESOS) MUNICIPAL	INVERSION EJERCIDA (PESOS)				AVANCES				% DE EJECUCION DEL LOS REC. EN EL AÑO X TRIM.	OBSERV.
							EN EL TRIMESTRE		ACUMULADA		FISICO		FINANCIERO			
							SUMA	MUNICIPAL	SUMA	MUNICIPAL	TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN TRONQUE CALKINI-NUNKINI KM. 8.1 A UNIDADES AGROPECUARIAS.	NUNKINI	IT	20/02/12 15/03/12	333MAPR001021	16-Feb-12	\$ 500,197.00	\$ 498,597.79	\$ 498,597.79	\$ 498,597.79	\$ 498,597.79	100.00	100.00	99.68	99.68	1.26%	C
PAVIMENTACION DE CALLES.	PUCNACHEN	IT	01/03/12 30/05/12	333MAPR001023	17-Feb-12	\$ 922,955.00	\$ 646,020.22	\$ 646,020.22	\$ 922,886.03	\$ 922,886.03	70.00	100.00	69.99	99.99	1.64%	C
REHABILITACION DE CALLES.	CALKINI	IT	02/03/12 31/05/12	333MAPR001024	17-Feb-12	\$ 2,571,516.00	\$ 2,569,457.97	\$ 2,569,457.97	\$ 2,569,457.97	\$ 2,569,457.97	100.00	100.00	99.92	99.92	6.51%	C
CONSTRUCCION DE TERRACERIA DEL CBTIS A PARCELAS LA SANTA CRUZ.	CALKINI	IT	12/03/12 30/03/12	333MAPR001025	17-Feb-12	\$ 158,848.00	\$ 158,308.08	\$ 158,308.08	\$ 158,308.08	\$ 158,308.08	100.00	100.00	99.66	99.66	0.40%	C
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 7 X 8 Y 10, 8 X 7 Y 9 EN LA LOCALIDAD DE XCACOCHE MUNICIPIO DE CALKINI.	XCACOCHE	IT	26/03/12 21/05/12	333MAPR001031	12-Mar-12	\$ 17,800.31	\$ 17,794.48	\$ 17,794.48	\$ 17,794.48	\$ 17,794.48	100.00	100.00	99.97	99.97	0.05%	C
CONSTRUCCION DE BODEGA PARA LA COMPRAVENTA DE INSUMOS PARA LA GANADERIA.	DZITBALCHE	IT	26/03/12 23/06/12	333MAPR001037	16-Mar-12	\$ 1,082,878.00	\$ 324,260.82	\$ 324,260.82	\$ 324,260.82	\$ 324,260.82	30.00	30.00	29.94	29.94	0.82%	C
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO CON SISTEMA DE RIEGO PARCELA LA "UVA"	BEAL	IT	20/04/12 15/05/12	333MAPR001039	19-Abr-12	\$ 280,000.00	\$ 4,103.45	\$ 4,103.45	\$ 4,103.45	\$ 4,103.45	100.00	100.00	1.47	1.47	0.01%	C
PERFORACION DE POZO Y EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE PARCELA "EL ZAPOTE"	BACABCHEN	IT	20/04/12 15/05/12	333MAPR001041	19-Abr-12	\$ 265,996.00	\$ 265,751.99	\$ 265,751.99	\$ 265,751.99	\$ 265,751.99	100.00	100.00	99.91	99.91	0.67%	C
TOTALES.....\$						\$ 20,130,396.80	\$ 11,482,802.41	\$ 11,482,802.41	\$ 16,651,043.32	\$ 16,651,043.32					20.63%	

DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

CARLOS SILVESTRE SEGOVIA HAU

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

PROFR. MARTIN TURRIZA EUAN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PROFR. CARLOS MIJANGOS AVILES

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. CARLOS EDUARDO SANGUINO CARRIL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PROFR. VICTOR MANUEL CAUCHU KU

DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL

PROFR. WILBERT UC HUCHIN

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECON.

ING. GERARDO ESPINOSA DE LA PEÑA




H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

SERVICIOS BASICOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CONCEPTO	C.D.I.	HABITAT	H. AYUNTAM.	PORCENT.
SC.- AGUA POTABLE.	\$ 71,177.91	\$ -	\$ 17,794.48	1.08%
SG.- ELECTRIFICACION.	\$ -	\$ -	\$ 1,244,538.79	75.69%
SO.- CENTROS DE SALUD.	\$ -	\$ -	\$ 381,893.83	23.23%
	71,177.91	0.00	\$ 1,644,227.10	100.00%

SERVICIOS BASICOS

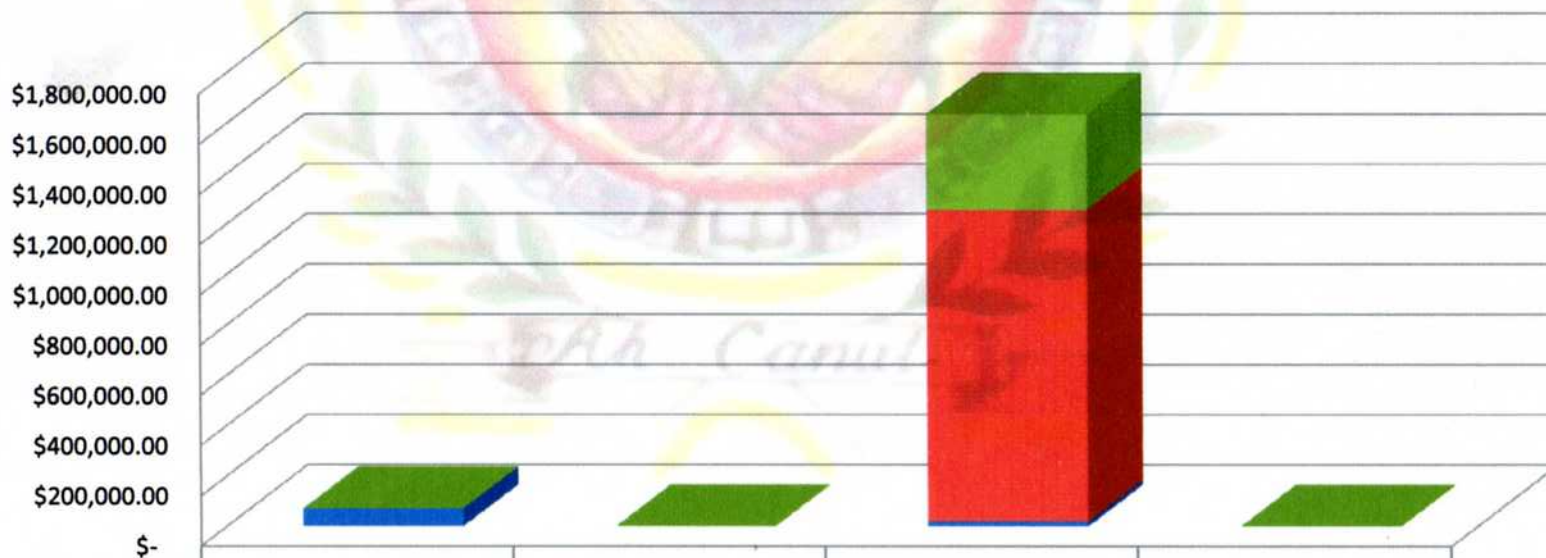

	C.D.I.	HABITAT	H. AYUNTAM.	PORCENT.
■ SO.- CENTROS DE SALUD.	\$-	\$-	\$381,893.83	23.23%
■ SG.- ELECTRIFICACION.	\$-	\$-	\$1,244,538.79	75.69%
■ SC.- AGUA POTABLE.	\$71,177.91	\$-	\$17,794.48	1.08%

